


新泉・和泉地区小中一貫教育校 工事工程

・神田川の河川工事構台を工事用搬入路として利用する（東京都と協議中）

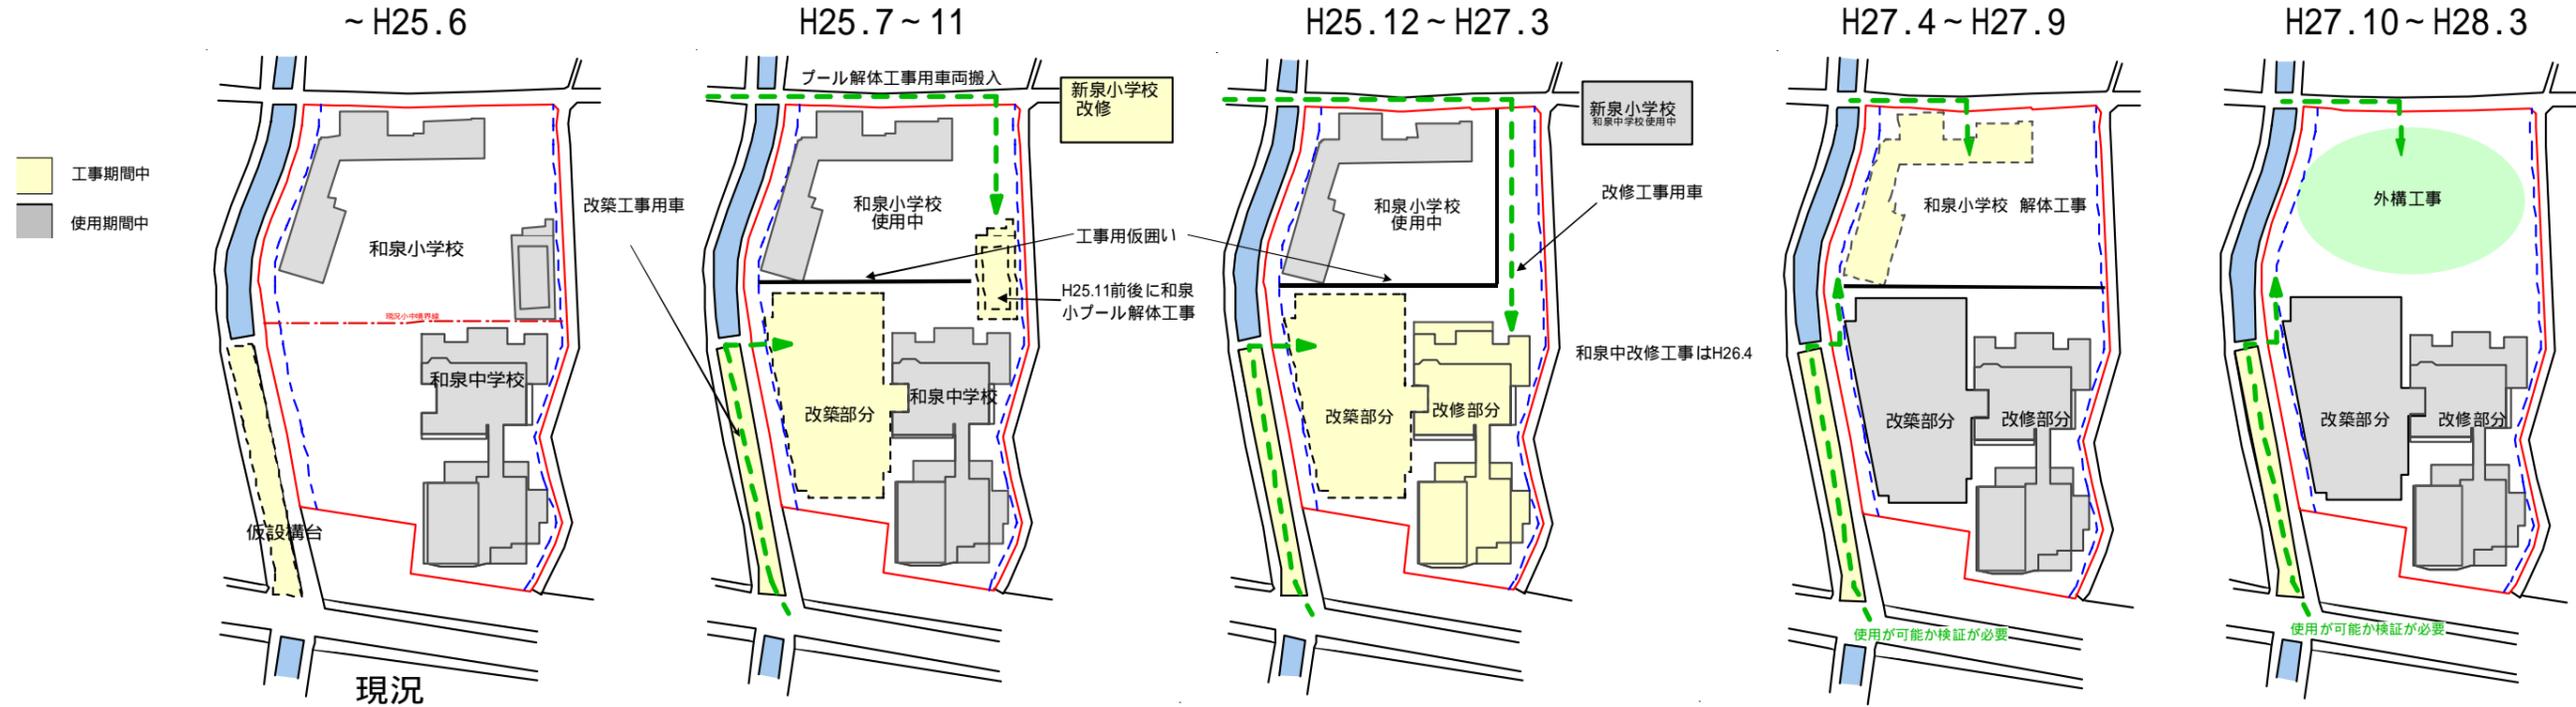

	2011 (H23)				2012 (H24)				2013 (H25)				2014 (H26)				2015 (H27)				2016 (H28)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			
改築工事																																
改修工事																																
埋蔵文化財調査																																
その他関連工事																																

Key Milestones and Durations:
 - 基本設計 (Basic Design): H23.4 - H24.1
 - 実施設計 (Implementation Design): H24.2 - H25.1
 - 埋蔵文化財調査 (Archaeological Survey): H23.6 (地盤調査), H24.2 (予備調査), H24.3 (本調査)
 - 神田川 仮設構台設置工事 (Kanda River Temporary Structure Installation): H24.3 - H28.3
 - 中学校移転準備期間 (Junior High School Relocation Preparation): H25.12 - H26.1
 - 3月下旬 和泉中学校移転 (Wazuka Junior High School Relocation): H26.3
 - 仮設工事1ヶ月を想定 (Temporary Work 1 month assumed): H26.3 - H26.4
 - 改築部分工事期間(約20ヶ月) (Renovation part construction period ~20 months): H26.4 - H27.10
 - 躯体工事 (Structural Work): H26.7 - H27.10
 - 改修部分工事期間(約11ヶ月) (Renovation part construction period ~11 months): H26.7 - H27.8
 - 準備期間 (Preparation Period): H27.1 - H27.3
 - 4/1 閉校 (School Closure): H27.4
 - 和泉小学校 解体工事 (Wazuka Elementary Demolition): H27.4 - H27.9
 - 環境整備工事(約5ヶ月) (Environment Improvement Work ~5 months): H27.10 - H28.3
 - 計画完了 (Plan Completed): H28.3

改修部分工事期間算定にあたって下記の改修内容を想定（ただし近隣からの苦情が出ない場合とする）

- ・構造壁の一部撤去と追加
- ・外壁外断熱化（吹き付け）
- ・全室内装更新
- ・全開口部更新
- ・屋上防水更新
- ・トイレを除く電気、機械設備更新
- （・アスベスト調査、撤去）
