

## 外環道の進捗状況について

外環道の進捗状況について、下記のとおり報告いたします。

### 記

#### 1 シールドトンネル工事の進捗状況

##### (1) 中央ジャンクション

南側Bランプシールドトンネル工事については、関係機関との調整や現場体制の構築など、事業用地内の準備が整ったため、掘進作業を1月30日より実施した。

##### (2) 東名ジャンクション

Aランプシールドトンネル工事については、関係機関との調整や現場体制の構築などの準備が整ったため、掘進作業を2月14日より実施した。

#### 2 添付資料

- ・シールドマシンの現在位置図

資料1

# シールドマシンの現在位置図

## ○大泉ジャンクション(南行・北行)

グリルドはどこ?



2024年02月19日 7時時点

📍 東京都練馬区石神井台3丁目 (大泉JCTから2050m)

JCT、ICは仮称


カラッキーはどこ?



2024年02月19日 7時時点

📍 東京都練馬区石神井台2丁目 (大泉JCTから2579m)

JCT、ICは仮称

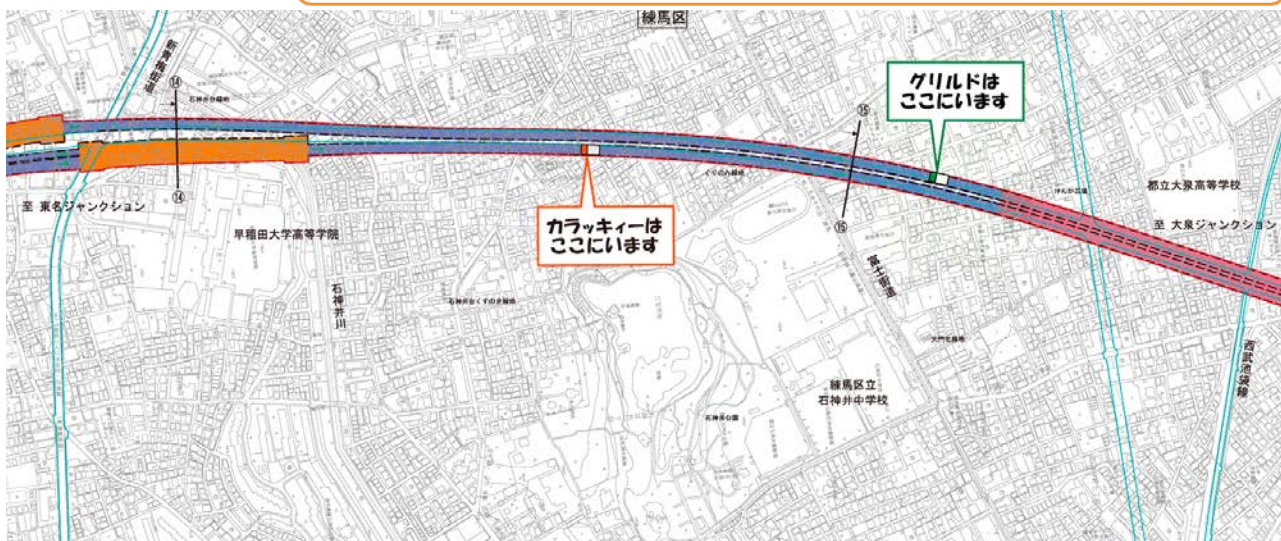


## ○中央ジャンクション (Bランプ)

中央Bランプ  
シールドマシンはどこ?

2024年02月19日 7時時点

📍 東京都調布市緑ヶ丘1丁目 (Bランプ立坑から2m)

JCT、ICは仮称

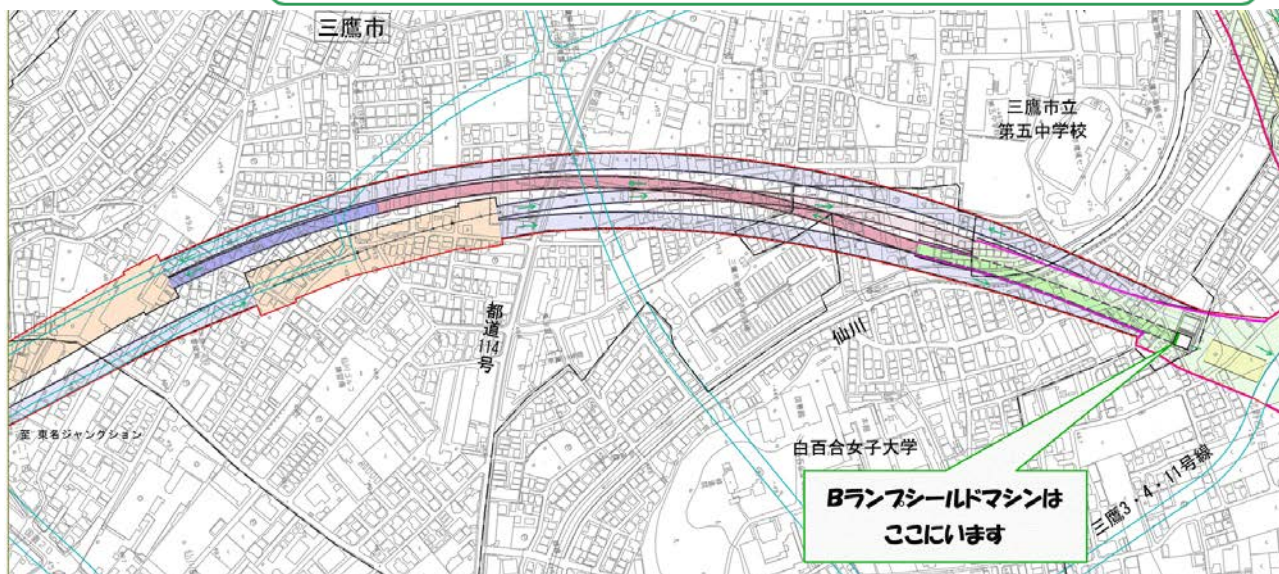

# ○東名ジャンクション (A・Hランプ)

**東名Aランプ**  
シールドマシンはどこ？

2024年02月19日 7時時点

📍 東京都世田谷区喜多見6丁目 (Aランプ立坑から0m)

JCT、ICIは仮称


**東名Hランプ**  
シールドマシンはどこ？

2024年02月19日 7時時点

📍 東京都世田谷区喜多見7丁目 (Hランプ立坑から246m)

※シールドマシンの部品交換に伴い掘進を一時停止しております。

JCT、ICIは仮称

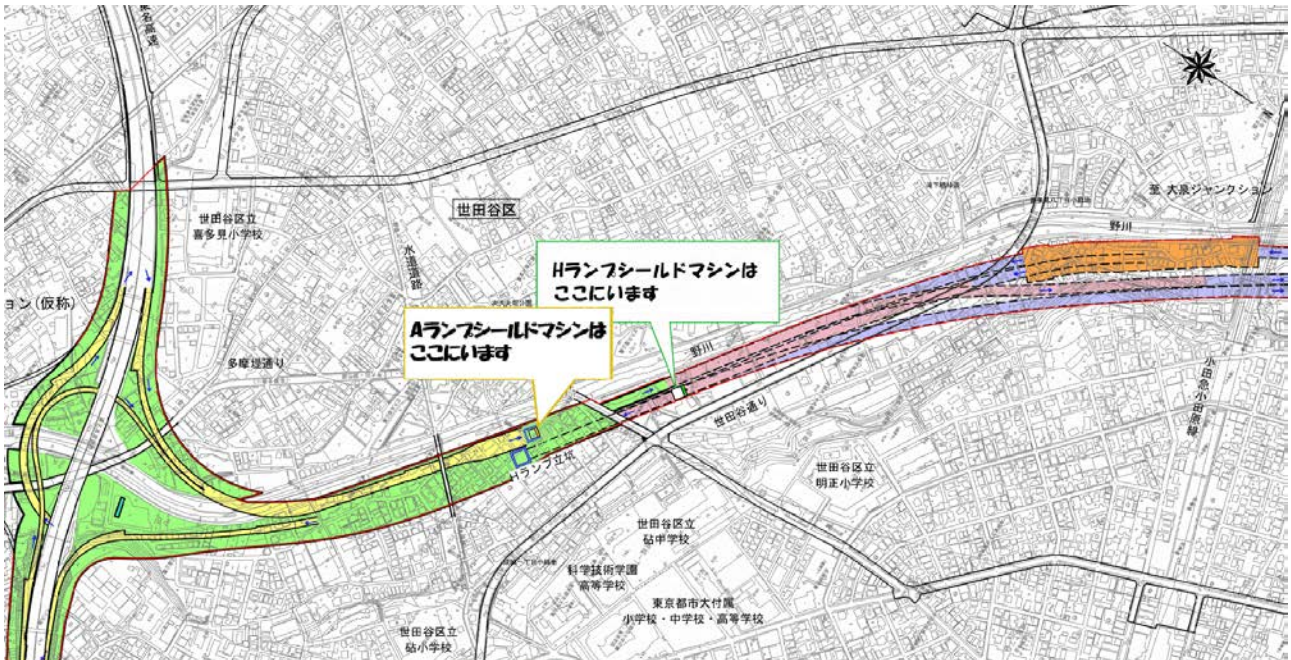

【令和6年2月19日現在】
